LAPORAN MANAJEMEN PROYEK

APLIKASI RECRUITMENT DAN JOB PORTAL TERINTEGRASI DENGAN UNIVERSITAS

(KarierKu)



KELOMPOK 6

NAMA :

Ravy Whienelda - 24.N1.0027

Pemilik Proyek: Dr. Albertus Dwiyoga Widiantoro, S.Kom., M.Kom.

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2026

STRUKTUR RINCIAN PEKERJAAN
(WORK BREAKDOWN STRUCTURE)

Nama Proyek : **Aplikasi Recruitment & Job Portal (KarierKu)**
Manajer Proyek : **Marcella Adelia Putri**
Bidang : **Sistem Informasi / Pengembangan Aplikasi**

WBS	GUGUS TUGAS *(TASK)* PROYEK
1.	**Fase Inisiasi**
1.1.	Hasil *(Deliverable)* A.1 – Project Charter
1.1.1.	Hasil *(Deliverable)* A.1.1 – Identifikasi Proyek
1.1.1.1.	Paket Pekerjaan A.1.1.1 – Menentukan tujuan dan ruang lingkup awal proyek berdasarkan permasalahan dan kebutuhan pengembangan aplikasi KarierKu
1.1.1.2.	Paket Pekerjaan A.1.1.2 – Menentukan target pengguna KarierKu yang meliputi pencari kerja, khususnya fresh graduate, serta perusahaan atau rekruter
1.2.	Hasil *(Deliverable)* A.2 – Identifikasi Stakeholder
1.2.1.	Hasil *(Deliverable)* A.2.1 – Identifikasi Kebutuhan Stakeholder
1.2.1.1.	Paket Pekerjaan A.2.1.1 – Mengidentifikasi kebutuhan pencari kerja dalam mencari lowongan, membuat profil, mengikuti uji kompetensi, dan mempersiapkan proses rekrutmen
1.2.1.2.	Paket Pekerjaan A.2.1.2 – Mengidentifikasi kebutuhan perusahaan/rekruter dalam mempublikasikan lowongan, menyeleksi kandidat, dan memperoleh informasi kompetensi pelamar
2.	**Fase Perencanaan dan Analisis Kebutuhan**
2.1.	Hasil *(Deliverable)* B.1– Analisis Kebutuhan Sistem
2.1.1.	Hasil *(Deliverable)* B.1.1 – Kebutuhan Pengguna
2.1.1.1.	Paket Pekerjaan B.1.1.1– Menganalisis kebutuhan pencari kerja berdasarkan proses pencarian lowongan, pengajuan lamaran, pengembangan profil, dan pembuktian kompetensi
2.1.1.2.	Paket pekerjaan B.1.1.2 – Menganalisis kebutuhan perusahaan berdasarkan proses pembuatan lowongan, pengelolaan pelamar, dan seleksi kandidat
2.1.2	Hasil *(Deliverable)* B.1.2 – Kebutuhan Fungsional
2.1.2.1.	Paket Pekerjaan B.1.2.1– Menentukan fitur registrasi, profil, dan lowongan yang mendukung proses pencarian serta pengelolaan informasi pengguna dan pekerjaan
2.1.2.2.	Paket Pekerjaan B.1.2.2 – Menentukan fitur Bounty System, Konverter Aktivitas, Simulasi Wawancara AI, dan Smart Matchmaking sesuai kebutuhan pengguna dan tujuan sistem
2.2.	Hasil *(Deliverable)* B.2 – Perencanaan Proyek
2.2.1.	Paket Pekerjaan B.2.1 – Menyusun jadwal pengembangan proyek berdasarkan tahapan pekerjaan, durasi, urutan kegiatan, dan target penyelesaian proyek
2.2.2.	Paket Pekerjaan B.2.2 – Menentukan kebutuhan sumber daya dan anggaran proyek yang meliputi kebutuhan tenaga kerja, perangkat, teknologi, infrastruktur, serta biaya pengembangan

3.	**Fase Perancangan Sistem dan UI/UX**
3.1.	Hasil *(Deliverable)* C.1 – Perancangan Sistem
3.1.1.	Hasil *(Deliverable)* C.1.1 – Perancangan Arsitektur Sistem
3.1.1.1.	Paket Pekerjaan C.1.1.1 – Merancang arsitektur frontend, backend, dan database untuk mendukung alur kerja serta kebutuhan sistem KarierKu
3.1.1.2.	Paket Pekerjaan C.1.1.2 – Merancang integrasi AI dan cloud untuk mendukung fitur berbasis kecerdasan buatan dan penyimpanan atau pengelolaan sistem secara daring
3.1.2.	Hasil *(Deliverable)* C.1.2 – Perancangan Database
3.1.2.1.	Paket Pekerjaan C.1.2.1 – Merancang struktur database PostgreSQL untuk menyimpan data pengguna, perusahaan, lowongan, lamaran, dan data pendukung lainnya
3.1.2.2.	Paket Pekerjaan C.1.2.2 – Merancang relasi dan kebutuhan data sistem agar setiap data dapat saling terhubung dan mendukung fungsi aplikasi
3.2.	Hasil *(Deliverable)* C.2 – Perancangan UI/UX
3.2.1.	Hasil *(Deliverable)* C.2.1 – Desain Antarmuka
3.2.1.1.	Paket Pekerjaan C.2.1.1 – Membuat wireframe dan prototype sebagai gambaran awal alur serta tampilan antarmuka KarierKu
3.2.1.2.	Paket Pekerjaan C.2.1.2 – Merancang tampilan website berbasis PWA yang responsif, mudah digunakan, dan dapat menyesuaikan berbagai perangkat
4.	**Fase Pengembangan MVP**
4.1.	Hasil *(Deliverable)* D.1 – Pengembangan Frontend
4.1.1.	Hasil *(Deliverable)* D.1.1 – Implementasi Antarmuka
4.1.1.1.	Paket Pekerjaan D.1.1.1– Mengembangkan halaman registrasi, login, dan profil untuk mendukung proses pendaftaran serta pengelolaan informasi pengguna
4.1.1.2.	Paket pekerjaan D.1.1.2 – Mengembangkan halaman pencarian dan pengelolaan lowongan untuk memudahkan pencari kerja menemukan pekerjaan dan perusahaan mengelola lowongan
4.2.	Hasil *(Deliverable)* D.2 – Pengembangan Backend dan Database
4.2.1.	Hasil *(Deliverable)* D.2.1 – Implementasi Backend
4.2.1.1.	Paket Pekerjaan D.2.1.1 – Mengembangkan API menggunakan Node.js dan Express.js untuk menghubungkan frontend dengan proses dan data pada sistem
4.2.1.2.	Paket Pekerjaan D.2.1.2 – Mengintegrasikan backend dengan PostgreSQL untuk mendukung penyimpanan dan pengelolaan data aplikasi
4.3.	Hasil *(Deliverable)* D.3 – Pengembangan Fitur Utama
4.3.1.	Hasil *(Deliverable)* D.3.1 – Bounty System dan Konverter Aktivitas
4.3.1.1.	Paket Pekerjaan D.3.1.1 – Mengembangkan fitur studi kasus/uji kompetensi yang dapat digunakan perusahaan untuk menilai kemampuan pelamar
4.3.1.2.	Paket Pekerjaan D.3.1.2 – Mengembangkan fitur konversi aktivitas non-formal untuk mengubah pengalaman organisasi, kepanitiaan, penelitian, dan aktivitas lainnya menjadi informasi kompetensi
4.3.2.	Hasil *(Deliverable)* D.3.2 – Simulasi Wawancara AI dan Smart Matchmaking
4.3.2.1.	Paket Pekerjaan D.3.2.1 – Mengembangkan fitur simulasi wawancara berbasis AI untuk membantu pengguna berlatih menghadapi proses wawancara kerja

4.3.2.2.	Paket Pekerjaan D.3.2.2 – Mengembangkan fitur Smart Matchmaking dan rekomendasi lowongan berdasarkan kesesuaian profil, kemampuan, dan kebutuhan pekerjaan
4.4.	Hasil *(Deliverable)* D.4 – Dashboard dan PWA
4.4.1.	Paket Pekerjaan D.4.1 – Mengembangkan dashboard pencari kerja dan perusahaan untuk menampilkan informasi serta aktivitas utama masing-masing pengguna
4.4.2.	Paket Pekerjaan D.4.2 – Mengimplementasikan teknologi Progressive Web App agar aplikasi dapat diakses secara responsif dan memiliki pengalaman penggunaan yang menyerupai aplikasi
5.	**Fase Integrasi dan Testing**
5.1.	Hasil *(Deliverable)* E.1 – Integrasi Sistem
5.1.1.	Paket Pekerjaan E.1.1 – Mengintegrasikan frontend, backend, database, dan AI agar seluruh komponen sistem dapat bekerja secara terhubung
5.1.2.	Paket Pekerjaan E.1.2 – Memastikan seluruh fitur dapat berjalan secara terintegrasi sesuai kebutuhan dan alur sistem yang telah dirancang
5.2.	Hasil *(Deliverable)* E.2 – Pengujian Sistem
5.2.1.	Hasil *(Deliverable)* E.2.1 – Pengujian Fungsional
5.2.1.1.	Paket Pekerjaan E.2.1.1 – Melakukan pengujian setiap fitur untuk memastikan fungsi sistem berjalan sesuai kebutuhan yang telah ditentukan
5.2.1.2.	Paket Pekerjaan E.2.1.2 – Memperbaiki bug dan kesalahan sistem yang ditemukan selama proses pengujian
5.2.2.	Hasil *(Deliverable)* E.2.2 – Pengujian PWA
5.2.2.1.	Paket Pekerjaan E.2.2.1 – Menguji responsivitas pada berbagai perangkat untuk memastikan tampilan dan fungsi aplikasi dapat digunakan dengan baik
5.2.2.2.	Paket Pekerjaan E.2.2.2 – Menguji kompatibilitas browser untuk memastikan aplikasi dapat berjalan dengan baik pada browser yang digunakan pengguna
6.	**Fase User Acceptance Test (UAT)**
6.1.	Hasil *(Deliverable)* F.1 – Persiapan UAT
6.1.1.	Paket Pekerjaan F.1.1 – Menyiapkan skenario pengujian pengguna berdasarkan fitur dan alur penggunaan utama aplikasi KarierKu
6.1.2.	Paket Pekerjaan F.1.2 – Menyiapkan data pengujian yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan UAT
6.2.	Hasil *(Deliverable)* F.2 – Pelaksanaan UAT
6.2.1.	Paket Pekerjaan F.2.1 – Melakukan pengujian bersama pengguna untuk mengetahui kesesuaian sistem dengan kebutuhan pengguna
6.2.2.	Paket Pekerjaan F.2.2 – Mengumpulkan masukan dan melakukan perbaikan berdasarkan hasil pengujian serta tanggapan pengguna
7.	**Fase Deployment**
7.1.	Hasil *(Deliverable)* G.1 – Persiapan Deployment
7.1.1.	Paket Pekerjaan G.1.1 – Menyiapkan cloud hosting dan database sebagai infrastruktur untuk menjalankan aplikasi KarierKu secara daring
7.1.2.	Paket Pekerjaan G.1.2 – Menyiapkan domain dan SSL untuk mendukung akses aplikasi yang aman melalui internet

7.2.	Hasil *(Deliverable)* G.2 – Implementasi Sistem
7.2.1.	Paket Pekerjaan G.2.1 – Melakukan deployment aplikasi KarierKu ke lingkungan produksi agar dapat diakses oleh pengguna
7.2.2.	Paket Pekerjaan G.2.2 – Melakukan pengecekan sistem setelah deployment untuk memastikan aplikasi dan seluruh fitur dapat berjalan dengan baik
8.	**Fase Evaluasi dan Penutupan**
8.1.	Hasil *(Deliverable)* H.1 – Evaluasi Proyek
8.1.1.	Paket Pekerjaan H.1.1 – Mengevaluasi hasil pengembangan MVP berdasarkan fitur yang telah dibuat dan kesesuaiannya dengan kebutuhan proyek
8.1.2.	Paket Pekerjaan H.1.2 – Mengevaluasi pencapaian tujuan dan kebutuhan proyek berdasarkan hasil pengembangan dan pengujian sistem
8.2.	Hasil *(Deliverable)* H.2 – Dokumentasi dan Penutupan
8.2.1.	Paket Pekerjaan H.2.1 – Menyusun dokumentasi sistem dan proyek yang mencakup hasil pengembangan, penggunaan sistem, serta informasi pendukung lainnya
8.2.2.	Paket Pekerjaan H.2.2 – Menyusun laporan akhir dan menutup proyek setelah seluruh pekerjaan, evaluasi, dan dokumentasi selesai dilakukan

Dibuat Oleh
Nama : Marcella Adelia Putri
Jabatan : Manajer proyek
Tanggal : 9 September 2026

Disetujui oleh
Nama : Dr. Albertus Dwiyoga Widiantoro, S.Kom., M.Kom
Jabatan : Pemilik Proyek
Tanggal : 9 September 2026

PENUGASAN TIM PROYEK

Proyek : Aplikasi Recruitment & Job portal (Karierku)

Bidang : Sistem Informasi / Pengembangan Aplikasi

Note: Tim proyek terdiri atas 4 posisi utama, dengan beberapa peran yang dapat dirangkap oleh anggota tim sesuai kebutuhan proyek.

Jabatan/Peranan	Tanggung Jawab & Wewenang	Nama
Project Manager	● Mengelola perencanaan, jadwal, alokasi anggaran, dan koordinasi tim secara keseluruhan. ● Memiliki wewenang untuk menyetujui perubahan scope kerja tim dan melaporkan progres langsung kepada pemilik proyek.	Marcella Adelia Putri
System Analyst	● Menganalisis kebutuhan bisnis, menentukan batasan scope MVP, dan menyusun SRS.	Marcella Adelia Putri
Full Stack Developer	● Mengembangkan tampilan antarmuka web interaktif menggunakan React.js dan fitur Progressive Web App. ● Membangun logika pada backend, serta mengimplementasikan fitur autentikasi pengguna, portal lowongan dan form lamaran. Mengintegrasikan fitur ekspor CV/portofolio dalam PDF. ● Memiliki wewenang terhadap arsitektur kode frontend dan integrasi API antarmuka.	Ravy Whienelda
UI-UX Designer	● Merancang user flow, wireframe, antarmuka UI responsif, dan membuat prototype interaktif.	Ravy Whienelda
AI & Backend Developer	● Merancang skema database PostgreSQL serta mengoptimalkan query data.	Bonifasius Frith Farandy

	● Mengembangkan backend service untuk fitur dan mengintegrasikan layanan third party API AI untuk fitur simulasi wawancara mandiri. ● Membangun algoritma Smart Matchmaking dan dasbor analitik pelamar untuk perusahaan. ● Berwenang untuk mengelola struktur data sistem dan keamanan komunikasi API AI.	
DevOps Engineer	● Menyiapkan, mengkonfigurasi, dan mengelola arsitektur cloud hosting serta server database. ● Membangun dan mengelola otomasi CI/CD pipeline untuk proses integrasi dan deployment kode dari repository ke server serta mengelola konfigurasi domain, sertifikasi keamanan SSL/HTTPS dan pengaturan caching. ● Melakukan pemantauan rutin kesehatan server, uptime, penggunaan resource, dan manajemen backup data. ● Memiliki wewenang untuk mengatur hak akses server dan database, mengeksekusi proses deployment, serta menerapkan protokol mitigasi saat server mengalami gangguan.	Bonifasius Frith Farandy
Quality Assurance (QA)	● Merancang dokumen test plan, standar jaminan kualitas, serta memimpin pelaksanaan User Acceptance Test bersama stakeholder dan calon pengguna. ● Menyusun dokumentasi pengujian serta menyusun manual book untuk pengguna maupun SOP pemeliharaan untuk perusahaan. ● Memiliki wewenang untuk memberikan keputusan formal/rekomendasi persetujuan rilis, apakah web ini sudah memenuhi standar kualitas sebelum diluncurkan.	Rangga Dwi

Tester	● Merancang skenario pengujian detail dan langkah pengujian untuk setiap fitur. ● Melakukan pengujian fungsionalitas menyeluruh (autentikasi, pembuatan lowongan, pengajuan berkas, bounty system, dan simulasi AI. ● Melakukan pengujian kompatibilitas dan responsivitas web. ● Melakukan uji beban dan performa pada REST API dan akses database sebagai bagian dari pengujian sistem. ● Mencatat seluruh kegiatan dan melaporkan bug/defect kepada tim developer. ● Memiliki wewenang memvalidasi status perbaikan bug dan menolak fitur yang belum lolos skenario pengujian.	Rangga Dwi

Catatan: Untuk kasus tertentu (bila dianggap perlu), untuk organisasi yang cukup besar bisa diformalkan dalam bentuk SK Direksi.

Dibuat Oleh		
Nama	**:**	**Marcella Adelia Putri**
Jabatan	**:**	**Manajer proyek**
Tanggal	**:**	**9 September 2026**

Disetujui oleh		
Nama	**:**	**Dr. Albertus Dwiyoga Widiantoro, S.Kom., M.Kom**
Jabatan	**:**	**Pemilik Proyek**
Tanggal	**:**	**9 September 2026**

JADWAL PROYEK

Nama Proyek : **Aplikasi Recruitment & Job Portal (KarierKu)**
Manager Proyek : **Marcella Adelia Putri**
Bidang : **Sistem Informasi / Pengembangan Aplikasi**

Dibuat oleh: Marcella Adelia Putri
Tanggal: 9 September 2026

WBS	Gugus Tugas (Task) Proyek	Durasi	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Predecessor
1.0	Fase Inisiasi	2 minggu	31/08/2026	13/09/2026	-
1.1	Project Charter	1 minggu	31/08/2026	06/09/2026	-
1.1.1	Identifikasi Proyek	1 minggu	31/08/2026	06/09/2026	-
1.1.1.1	Menentukan tujuan dan ruang lingkup awal proyek	3 hari	31/08/2026	02/09/2026	-
1.1.1.2	Menentukan target pengguna KarierKu	2 hari	03/09/2026	04/09/2026	1.1.1.1
1.2	Identifikasi Stakeholder	1 minggu	07/09/2026	13/09/2026	1.1
1.2.1	Identifikasi Kebutuhan Stakeholder	1 minggu	07/09/2026	07/09/2026	1.1
1.2.1.1	Mengidentifikasi kebutuhan pencari kerja	3 hari	07/09/2026	09/09/2026	1.1
1.2.1.2	Mengidentifikasi kebutuhan perusahaan/rekruter	3 hari	10/09/2026	12/09/2026	1.2.1.1
2.0	Fase Perencanaan dan Analisis Kebutuhan	3 minggu	14/09/2026	04/10/2026	1.2
2.1	Analisis Kebutuhan Sistem	2 minggu	14/09/2026	27/09/2026	1.2
2.1.1	Kebutuhan Pengguna	1 minggu	14/09/2026	20/09/2026	1.2
2.1.1.1	Menganalisis kebutuhan pencari kerja	3 hari	14/09/2026	16/09/2026	1.2
2.1.1.2	Menganalisis kebutuhan perusahaan	3 hari	17/09/2026	19/09/2026	2.1.1.1
2.1.2	Kebutuhan Fungsional	1 minggu	21/09/2026	27/09/2026	2.1.1

WBS	Gugus Tugas (Task) Proyek	Durasi	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Predecessor
2.1.2.1	Menentukan fitur registrasi, profil, dan lowongan	3 hari	21/09/2026	23/09/2026	2.1.1
2.1.2.2	Menentukan fitur Bounty System, Konverter Aktivitas, Simulasi Wawancara AI, dan Smart Matchmaking	4 hari	24/09/2026	27/09/2026	2.1.2.1
2.2	Perencanaan Proyek	1 minggu	28/09/2026	04/10/2026	2.1
2.2.1	Menyusun jadwal pengembangan proyek	3 hari	28/09/2026	30/09/2026	2.1
2.2.2	Menentukan kebutuhan sumber daya dan anggaran proyek	4 hari	01/10/2026	04/10/2026	2.2.1
3.0	Fase Perancangan Sistem dan UI/UX	3 minggu	05/10/2026	25/10/2026	2.2
3.1	Perancangan Sistem	2 minggu	05/10/2026	18/10/2026	2.2
3.1.1	Perancangan Arsitektur Sistem	1 minggu	05/10/2026	11/10/2026	2.2
3.1.1.1	Merancang arsitektur frontend, backend, dan database	4 hari	05/10/2026	08/10/2026	2.2
3.1.1.2	Merancang integrasi AI dan cloud	3 hari	09/10/2026	11/10/2026	3.1.1.1
3.1.2	Perancangan Database	1 minggu	12/10/2026	18/10/2026	3.1.1
3.1.2.1	Merancang struktur database PostgreSQL	3 hari	12/10/2026	14/10/2026	3.1.1
3.1.2.2	Merancang relasi dan kebutuhan data sistem	4 hari	15/10/2026	18/10/2026	3.1.2.1
3.2	Perancangan UI/UX	1 minggu	19/10/2026	25/10/2026	3.1
3.2.1	Desain Antarmuka	1 minggu	19/10/2026	25/10/2026	3.1
3.2.1.1	Membuat wireframe dan prototype	4 hari	19/10/2026	22/10/2026	3.1
3.2.1.2	Merancang tampilan website berbasis PWA	3 hari	23/10/2026	25/10/2026	3.2.1
4.0	Fase Pengembangan MVP	10 minggu	26/10/2026	03/01/2027	3.2
4.1	Pengembangan Frontend	3 minggu	26/10/2026	15/11/2026	3.2
4.1.1	Implementasi Antarmuka	3 minggu	26/10/2026	15/11/2026	3.2
4.1.1.1	Mengembangkan halaman registrasi, login, dan profil	1 minggu	26/10/2026	01/11/2026	3.2
4.1.1.2	Mengembangkan halaman pencarian dan pengelolaan lowongan	2 minggu	02/11/2026	15/11/2026	4.1.1.1
4.2	Pengembangan Backend dan Database	3 minggu	16/11/2026	06/12/2026	4.1

WBS	Gugus Tugas (Task) Proyek	Durasi	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Predecessor
4.2.1	Implementasi Backend	3 minggu	16/11/2026	06/12/2026	4.1
4.2.1.1	Mengembangkan API menggunakan Node.js dan Express.js	2 minggu	16/11/2026	29/11/2026	4.1
4.2.1.2	Mengintegrasikan backend dengan PostgreSQL	1 minggu	30/11/2026	06/12/2026	4.2.1.1
4.3	Pengembangan Fitur Utama	4 minggu	07/12/2026	03/01/2027	4.2
4.3.1	Bounty System dan Konverter Aktivitas	2 minggu	07/12/2026	20/12/2026	4.2
4.3.1.1	Mengembangkan fitur studi kasus/uji kompetensi	1 minggu	07/12/2026	13/12/2026	4.2
4.3.1.2	Mengembangkan fitur konversi aktivitas non-formal	1 minggu	14/12/2026	20/12/2026	4.3.1.1
4.3.2	Simulasi Wawancara AI dan Smart Matchmaking	2 minggu	21/12/2026	03/01/2027	4.3.1
4.3.2.1	Mengembangkan fitur simulasi wawancara berbasis AI	1 minggu	21/12/2026	27/12/2026	4.3.1
4.3.2.2	Mengembangkan fitur Smart Matchmaking dan rekomendasi lowongan	1 minggu	28/12/2026	03/01/2027	4.3.2.1
4.4	Dashboard dan PWA	10 minggu (dikerjakan paralel selama pengembangan MVP)	26/10/2026	03/01/2027	4.1
4.4.1	Mengembangkan dashboard pencari kerja dan perusahaan	3 minggu	07/12/2026	27/12/2026	4.2
4.4.2	Mengimplementasikan teknologi Progressive Web App	1 minggu	28/12/2026	03/01/2027	4.4.1
5.0	Fase Integrasi dan Testing	3 minggu	04/01/2027	24/01/2027	4.3.2
5.1	Integrasi Sistem	1 minggu	04/01/2027	10/01/2027	4.3.2
5.1.1	Mengintegrasikan frontend, backend, database, dan AI	4 hari	04/01/2027	07/01/2027	4.3.2
5.1.2	Memastikan seluruh fitur dapat berjalan secara terintegrasi	3 hari	08/01/2027	10/01/2027	5.1.1
5.2	Pengujian Sistem	2 minggu	11/01/2027	24/01/2027	5.1
5.2.1	Pengujian Fungsional	1 minggu	11/01/2027	17/01/2027	5.1
5.2.1.1	Melakukan pengujian setiap fitur	4 hari	11/01/2027	14/01/2027	5.1

WBS	Gugus Tugas (Task) Proyek	Durasi	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Predecessor
5.2.1.2	Memperbaiki bug dan kesalahan sistem	3 hari	15/01/2027	17/01/2027	5.2.1.1
5.2.2	Pengujian PWA	1 minggu	18/01/2027	24/01/2027	5.2.1
5.2.2.1	Menguji responsivitas pada berbagai perangkat	3 hari	18/01/2027	20/01/2027	5.2.1
5.2.2.2	Menguji kompatibilitas browser	4 hari	21/01/2027	24/01/2027	5.2.2.1
6.0	Fase User Acceptance Test (UAT)	1 minggu	25/01/2027	31/01/2027	5.2.2
6.1	Persiapan UAT	3 hari	25/01/2027	27/01/2027	5.2.2
6.1.1	Menyiapkan skenario pengujian pengguna	1 hari	25/01/2027	25/01/2027	5.2.2
6.1.2	Menyiapkan data pengujian	2 hari	26/01/2027	27/01/2027	6.1.1
6.2	Pelaksanaan UAT	4 hari	28/01/2027	31/01/2027	6.1
6.2.1	Melakukan pengujian bersama pengguna	2 hari	28/01/2027	29/01/2027	6.1
6.2.2	Mengumpulkan masukan dan melakukan perbaikan	2 hari	30/01/2027	31/01/2027	6.2.1
7.0	Fase Deployment	1 minggu	01/02/2027	07/02/2027	6.2
7.1	Persiapan Deployment	3 hari	01/02/2027	03/02/2027	6.2
7.1.1	Menyiapkan cloud hosting dan database	2 hari	01/02/2027	02/02/2027	6.2
7.1.2	Menyiapkan domain dan SSL	1 hari	03/02/2027	03/02/2027	7.1.1
7.2	Implementasi Sistem	4 hari	04/02/2027	07/02/2027	7.1
7.2.1	Melakukan deployment aplikasi KarierKu	2 hari	04/02/2027	05/02/2027	7.1.2
7.2.2	Melakukan pengecekan sistem setelah deployment	2 hari	06/02/2027	07/02/2027	7.2.1
8.0	Fase Evaluasi dan Penutupan	1 minggu	08/02/2027	14/02/2027	7.2
8.1	Evaluasi Proyek	3 hari	08/02/2027	10/02/2027	7.2
8.1.1	Mengevaluasi hasil pengembangan MVP	2 hari	08/02/2027	09/02/2027	7.2
8.1.2	Mengevaluasi pencapaian tujuan dan kebutuhan proyek	1 hari	10/02/2027	10/02/2027	8.1.1
8.2	Dokumentasi dan Penutupan	4 hari	11/02/2027	14/02/2027	8.1
8.2.1	Menyusun dokumentasi sistem dan proyek	2 hari	11/02/2027	12/02/2027	8.1.2

WBS	Gugus Tugas (Task) Proyek	Durasi	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Predecessor
8.2.2	Menyusun laporan akhir dan menutup proyek	2 hari	13/02/2027	14/02/2027	8.2.1

Dibuat Oleh		
Nama	:	Marcella Adelia Putri
Jabatan	:	Manajer proyek
Tanggal	:	9 September 2026

Disetujui oleh		
Nama	:	Dr. Albertus Dwiyoga Widiantoro, S.Kom., M.Kom
Jabatan	:	Pemilik Proyek
Tanggal	:	9 September 2026

RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB) PROYEK

Nama Proyek : **Aplikasi Recruitment & Job Portal (KarierKu)**

Manajer Proyek : **Marcella Adelia Putri**

Bidang : **Sistem Informasi / Pengembangan Aplikasi**

Dibuat oleh : **Marcella Adelia Putri**

Tanggal : **9 September 2026**

WBS	Gugus Tugas (Task) Proyek	Jam Tenaga Kerja	Tarif Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja	Biaya Tenaga Kerja	Biaya Lain2	Total per Task
1.0	Fase Inisiasi (2 Minggu)	80			Rp8.000.000	Rp2.000.000	Rp10.000.000
1.1	Project Charter						
1.1.1	Identifikasi Proyek						
1.1.1.1	Menentukan tujuan dan ruang lingkup awal proyek	24	Rp100.000	2	Rp2.400.000	Rp1.000.000	Rp3.400.000
1.1.1.2	Menentukan target pengguna KarierKu	8	Rp100.000	1	Rp800.000		Rp800.000
1.2	Identifikasi Stakeholder						
1.2.1	Identifikasi Kebutuhan Stakeholder						
1.2.1.1	Mengidentifikasi kebutuhan pencari kerja	24	Rp100.000	2	Rp2.400.000	Rp500.-000	Rp2.900.000
1.2.1.2	Mengidentifikasi kebutuhan perusahaan/rekruter	24	Rp100.000	2	Rp2.400.000	Rp500.-000	Rp2.900.000
2.0	Fase Perencanaan dan Analisis Kebutuhan (3 Minggu)	176			Rp17.600.000	Rp3.000.000	Rp20.600.000
2.1	Analisis Kebutuhan Sistem						
2.1.1	Kebutuhan Pengguna						
2.1.1.1	Menganalisis kebutuhan pencari kerja	24	Rp100.000	2	Rp2.400.000	Rp750.000	Rp3.150.000
2.1.1.2	Menganalisis kebutuhan perusahaan	24	Rp100.000	2	Rp2.400.000	Rp750.000	Rp3.150.000
2.1.2	Kebutuhan Fungsional						

WBS	Gugus Tugas (Task) Proyek	Jam Tenaga Kerja	Tarif Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja	Biaya Tenaga Kerja	Biaya Lain2	Total per Task
2.1.2.1	Menentukan fitur registrasi, profil, dan lowongan	36	Rp100.000	3	Rp3.600.000		Rp3.600.000
2.1.2.2	Menentukan fitur Bounty System, Konverter Aktivitas, Simulasi Wawancara AI, dan Smart Matchmaking	48	Rp100.000	3	Rp4.800.000	Rp500.000	Rp5.300.000
2.2	Perencanaan Proyek						
2.2.1	Menyusun jadwal pengembangan proyek	12	Rp100.000	1	Rp1.200.000		Rp1.200.000
2.2.2	Menentukan kebutuhan sumber daya dan anggaran proyek	32	Rp100.000	2	Rp3.200.000	Rp1.000.000	Rp4.200.000
3.0	Fase Perancangan Sistem dan UI/UX (3 Minggu)	264			Rp26.400.000	Rp5.000.000	Rp31.400.000
3.1	Perancangan Sistem						
3.1.1	Perancangan Arsitektur Sistem						
3.1.1.1	Merancang arsitektur frontend, backend, dan database	48	Rp100.000	3	Rp4.800.000		Rp4.800.000
3.1.1.2	Merancang integrasi AI dan cloud	48	Rp100.000	4	Rp4.800.000	Rp1.500.000	Rp6.300.000
3.1.2	Perancangan Database						
3.1.2.1	Merancang struktur database PostgreSQL	36	Rp100.000	3	Rp3.600.000		Rp3.600.000
3.1.2.2	Merancang relasi dan kebutuhan data sistem	48	Rp100.000	3	Rp4.800.000		Rp4.800.000
3.2	Perancangan UI/UX						
3.2.1	Desain Antarmuka						
3.2.1.1	Membuat wireframe dan prototype	48	Rp100.000	3	Rp4.800.000	Rp2.000.000	Rp6.800.000
3.2.1.2	Merancang tampilan website berbasis PWA	36	Rp100.000	3	Rp3.600.000	Rp1.500.000	Rp5.100.000
4.0	Fase Pengembangan MVP (10 Minggu)	1.020			Rp102.000.000	Rp36.000.000	Rp138.000.000
4.1	Pengembangan Frontend						
4.1.1	Implementasi Antarmuka						
4.1.1.1	Mengembangkan halaman registrasi, login, dan profil	84	Rp100.000	3	Rp8.400.000		Rp8.400.000

WBS	Gugus Tugas (Task) Proyek	Jam Tenaga Kerja	Tarif Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja	Biaya Tenaga Kerja	Biaya Lain2	Total per Task
4.1.1.2	Mengembangkan halaman pencarian dan pengelolaan lowongan	168	Rp100.000	3	Rp16.800.000	Rp3.000.000	Rp19.800.000
4.2	Pengembangan Backend dan Database						
4.2.1	Implementasi Backend						
4.2.1.1	Mengembangkan API menggunakan Node.js dan Express.js	168	Rp100.000	3	Rp16.800.000	Rp3.000.000	Rp19.800.000
4.2.1.2	Mengintegrasikan backend dengan PostgreSQL	84	Rp100.000	3	Rp8.400.000	Rp2.000.000	Rp10.400.000
4.3	Pengembangan Fitur Utama						
4.3.1	Bounty System dan Konverter Aktivitas						
4.3.1.1	Mengembangkan fitur studi kasus/uji kompetensi	56	Rp100.000	2	Rp5.600.000	Rp2.000.000	Rp7.600.000
4.3.1.2	Mengembangkan fitur konversi aktivitas non-formal	56	Rp100.000	2	Rp5.600.000	Rp2.000.000	Rp7.600.000
4.3.2	Simulasi Wawancara AI dan Smart Matchmaking						
4.3.2.1	Mengembangkan fitur simulasi wawancara berbasis AI	84	Rp100.000	3	Rp8.400.000	Rp9.000.000	Rp17.400.000
4.3.2.2	Mengembangkan fitur Smart Matchmaking dan rekomendasi lowongan	84	Rp100.000	3	Rp8.400.000	Rp9.000.000	Rp17.400.000
4.4	Dashboard dan PWA						
4.4.1	Mengembangkan dashboard pencari kerja dan perusahaan	180	Rp100.000	3	Rp18.000.000	Rp3.000.000	Rp21.000.000
4.4.2	Mengimplementasikan teknologi Progressive Web App	56	Rp100.000	2	Rp5.600.000	Rp3.000.000	Rp8.600.000
5.0	Fase Integrasi dan Testing (3 Minggu)	240			Rp24.000.000	Rp6.000.000	Rp30.000.000
5.1	Integrasi Sistem						
5.1.1	Mengintegrasikan frontend, backend, database, dan AI	64	Rp100.000	4	Rp6.400.000		Rp6.400.000
5.1.2	Memastikan seluruh fitur dapat berjalan secara terintegrasi	36	Rp100.000	3	Rp3.600.000		Rp3.600.000
5.2	Pengujian Sistem						

WBS	Gugus Tugas (Task) Proyek	Jam Tenaga Kerja	Tarif Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja	Biaya Tenaga Kerja	Biaya Lain2	Total per Task
5.2.1	Pengujian Fungsional						
5.2.1.1	Melakukan pengujian setiap fitur	48	Rp100.000	3	Rp4.800.000	Rp3.000.000	Rp7.800.000
5.2.1.2	Memperbaiki bug dan kesalahan sistem	36	Rp100.000	3	Rp3.600.000	Rp1.000.000	Rp4.600.000
5.2.2	Pengujian PWA						
5.2.2.1	Menguji responsivitas pada berbagai perangkat	24	Rp100.000	2	Rp2.400.000	Rp1.000.000	Rp3.400.000
5.2.2.2	Menguji kompatibilitas browser	32	Rp100.000	2	Rp3.200.000	Rp1.000.000	Rp4.200.000
6.0	Fase User Acceptance Test (UAT) (1 Minggu)	44			Rp4.400.000	Rp6.000.000	Rp10.400.000
6.1	Persiapan UAT						
6.1.1	Menyiapkan skenario pengujian pengguna	4	Rp100.000	1	Rp400.000		Rp400.000
6.1.2	Menyiapkan data pengujian	8	Rp100.000	1	Rp800.000		Rp800.000
6.2	Pelaksanaan UAT						
6.2.1	Melakukan pengujian bersama pengguna	16	Rp100.000	2	Rp1.600.000	Rp4.000.000	Rp5.600.000
6.2.2	Mengumpulkan masukan dan melakukan perbaikan	16	Rp100.000	2	Rp1.600.000	Rp2.000.000	Rp3.600.000
7.0	Fase Deployment (1 Minggu)	28			Rp2.800.000	Rp5.000.000	Rp7.800.000
7.1	Persiapan Deployment						
7.1.1	Menyiapkan cloud hosting dan database	8	Rp100.000	1	Rp800.000	Rp3.000.000	Rp3.800.000
7.1.2	Menyiapkan domain dan SSL	4	Rp100.000	1	Rp400.000	Rp2.000.000	Rp2.400.000
7.2	Implementasi Sistem						
7.2.1	Melakukan deployment aplikasi KarierKu	8	Rp100.000	1	Rp800.000		Rp800.000
7.2.2	Melakukan pengecekan sistem setelah deployment	8	Rp100.000	1	Rp800.000		Rp800.000
8.0	Fase Evaluasi dan Penutupan (1 Minggu)	28			Rp2.800.000	Rp3.000.000	Rp5.800.000

WBS	Gugus Tugas (Task) Proyek	Jam Tenaga Kerja	Tarif Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja	Biaya Tenaga Kerja	Biaya Lain2	Total per Task
8.1	Evaluasi Proyek						
8.1.1	Mengevaluasi hasil pengembangan MVP	8	Rp100.000	1	Rp800.000		Rp800.000
8.1.2	Mengevaluasi pencapaian tujuan dan kebutuhan proyek	4	Rp100.000	1	Rp400.000		Rp400.000
8.2	Dokumentasi dan Penutupan						
8.2.1	Menyusun dokumentasi sistem dan proyek	8	Rp100.000	1	Rp800.000	Rp2.000.000	Rp2.800.000
8.2.2	Menyusun laporan akhir dan menutup proyek	8	Rp100.000	1	Rp800.000	Rp1.000.000	Rp1.800.000
Lain-lain:							
Dana Cadangan Proyek							Rp10.000.000
Sub-Total:							Rp254.000.000
PERENCANAAN TOTAL							Rp264.000.000

Komponen Biaya Non-SDM/Biaya Lain-lain	Anggaran
Koordinasi, rapat, dan kebutuhan administrasi proyek	Rp2.000.000
Analisis kebutuhan persiapan data	Rp3.000.000
Software/tools desain dan prototyping	Rp5.000.000
Cloud/server selama pengembangan	Rp12.000.000
AI/third-party API untuk simulasi wawancara dan matchmaking	Rp18.000.000
Tools/data preparation/migrasi data awal	Rp6.000.000
Testing perangkat, browser, dan performance	Rp6.000.000
Pelatihan dan pelaksanaan UAT	Rp6.000.000

Domain, SSL, dan kebutuhan deployment	**Rp5.000.000**
Dokumentasi, manual, dan pelaporan akhir	**Rp3.000.000**
Total Biaya Non-SDM/Biaya Lain-lain	**Rp66.000.000**

Pekerja	Jam Kerja	Tarif/Jam	Total
Project Manager	**240**	**Rp100.000**	**Rp24.000.000**
System/Business Analyst	**160**	**Rp100.000**	**Rp16.000.000**
Full Stack Developer	**480**	**Rp100.000**	**Rp48.000.000**
AI & Backend Developer	**480**	**Rp100.000**	**Rp48.000.000**
UI/UX Designer	**160**	**Rp100.000**	**Rp16.000.000**
DevOps Engineer	**120**	**Rp100.000**	**Rp12.000.000**
QA & Tester	**240**	**Rp100.000**	**Rp24.000.000**
TOTAL	**1.880**		**Rp188.000.000**

Dibuat Oleh		
Nama	**:**	**Marcella Adelia Putri**
Jabatan	**:**	**Manajer proyek**
Tanggal	**:**	**9 September 2026**

Disetujui oleh		
Nama	**:**	**Dr. Albertus Dwiyoga Widiantoro, S.Kom., M.Kom**
Jabatan	**:**	**Pemilik Proyek**
Tanggal	**:**	**9 September 2026**

COMMUNICATION PLAN

1. PERTEMUAN (*MEETING*)

JENIS PERTEMUAN	AGENDA	WAKTU	PENAGGUNG JAWAB	PARTISIPAN	MASUKAN	KELUARAN
Manajemen						
Pertemuan Manajemen	**Membahas perkembangan proyek, persetujuan desain dan anggaran, perubahan kebutuhan pengguna, risiko, serta kendala proyek.**	**Setiap akhir fase dan sesuai kebutuhan**	**Manajer Proyek**	**Manajer Proyek, Project Owner.**	**Laporan kemajuan, kebutuhan persetujuan, risiko, dan kendala.**	**Keputusan dan persetujuan terkait desain, anggaran, perubahan kebutuhan, serta tindak lanjut.**
Pertemuan Pembukaan	**Menyampaikan tujuan, ruang lingkup, kebutuhan pengguna, pembagian tugas, jadwal, dan mekanisme komunikasi proyek.**	**Awal proyek**	**Manajer Proyek**	**Manajer Proyek, Project Owner, seluruh tim proyek.**	**Project Charter, kebutuhan pengguna, WBS, penugasan tim, dan jadwal proyek.**	**Kesepahaman tujuan, ruang lingkup, pembagian tugas, dan mekanisme komunikasi.**
Pertemuan Tim Proyek	**Membahas perkembangan pekerjaan, kebutuhan pengguna, risiko, dan kendala teknis.**	**Mingguan**	**Manajer Proyek**	**Seluruh tim proyek.**	**Hasil pekerjaan, kebutuhan pencari kerja dan perusahaan/re kruter, risiko, dan kendala teknis.**	**Pembaruan pekerjaan, keputusan tindak lanjut, dan dokumentasi kebutuhan pengguna.**
Pertemuan UAT dan Go-Live	**Menyampaikan informasi dan pelatihan penggunaan sistem serta membahas kesiapan UAT, migrasi data, dan go-live.**	**Sebelum UAT dan go-live**	**Manajer Proyek**	**Manajer Proyek, Project Owner, tim proyek, kepala unit karya.**	**Skenario UAT, panduan sistem, hasil pengujian, dan kesiapan migrasi data.**	**Hasil pelatihan, masukan pengguna, kesiapan UAT, migrasi data, dan go-live.**
Pertemuan Penutupan	**Mengevaluasi hasil proyek, pencapaian tujuan, kendala, dan dokumentasi akhir**	**Akhir proyek**	**Manajer Proyek**	**Manajer Proyek, Project Owner, seluruh tim proyek.**	**Hasil evaluasi dan laporan akhir.**	**Keputusan penutupan proyek dan dokumentasi akhir.**

2. PELAPORAN (*REPORTING*)

JENIS PELAPORAN	ITEM	WAKTU	PENANGGUNG JAWAB	DISTRIBUSI	MASUKAN	KELUARAN
Laporan Kemajuan Proyek *(Project Progress Report)*	**Perkembangan pekerjaan, pencapaian, jadwal, risiko, dan kendala teknis.**	**Mingguan**	**Manajer Proyek**	**Project Owner dan tim proyek.**	**Laporan perkembangan dari anggota tim.**	**Informasi status proyek, risiko, kendala, dan tindak lanjut.**
Status Acara / Agenda Pertemuan *(Status Meeting Agenda)*	**Agenda pembahasan, kebutuhan keputusan, risiko, dan kendala yang akan dibahas.**	**Sebelum setiap pertemuan**	**Manajer Proyek**	**Project Owner dan pihak terkait.**	**Status pekerjaan dan isu yang perlu dibahas.**	**Agenda pertemuan dan daftar hal yang perlu ditindaklanjuti.**
Catatan Pertemuan *(Minutes of Meeting)*	**Hasil pembahasan, keputusan, perubahan kebutuhan pengguna, risiko, dan tindak lanjut.**	**Setelah setiap pertemuan**	**Manajer Proyek**	**Peserta pertemuan dan pihak terkait. Data pengguna hanya didistribusikan kepada pihak yang berkepentingan sesuai kebutuhan proyek.**	**Hasil diskusi dan keputusan.**	**Dokumentasi hasil pertemuan dan daftar tindak lanjut.**
Laporan UAT dan Go-Live	**Hasil UAT, temuan pengujian, kesiapan migrasi data, pelatihan, dan status go-live.**	**Sebelum dan setelah UAT/go-live**	**Manajer Proyek**	**Project Owner, tim proyek, dan kepala unit karya.**	**Hasil pengujian, masukan pengguna, dan status kesiapan sistem.**	**Laporan kesiapan, daftar temuan, dan tindak lanjut.**

PENJADWALAN MICROSOFT PROJECT

(Gantt Chart, Task Sheet & Resource Sheet)

Nama Proyek : Aplikasi Recruitment & Job Portal (KarierKu)
Manajer Proyek : Marcella Adelia Putri
Bidang : Sistem Informasi / Pengembangan Aplikasi
Kode Dokumen : PLAN-06

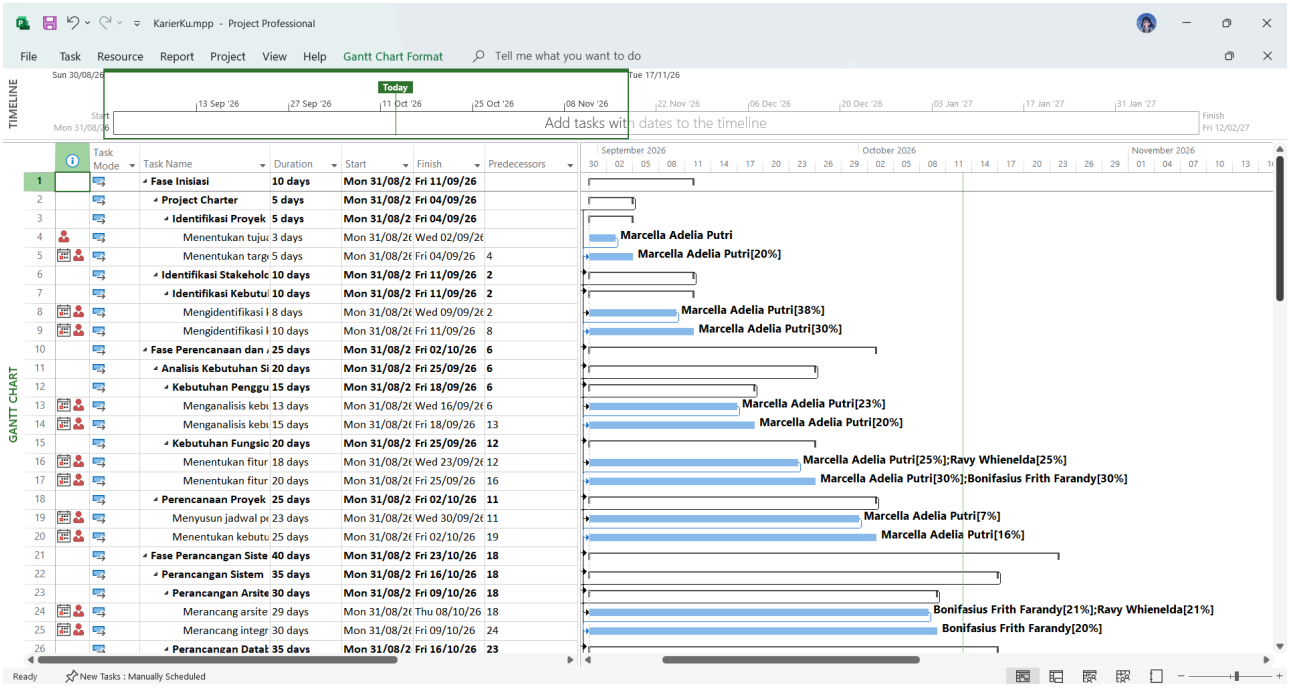
Dibuat oleh : Marcella Adelia Putri (Project Manager)
Tanggal : 16/09/2026

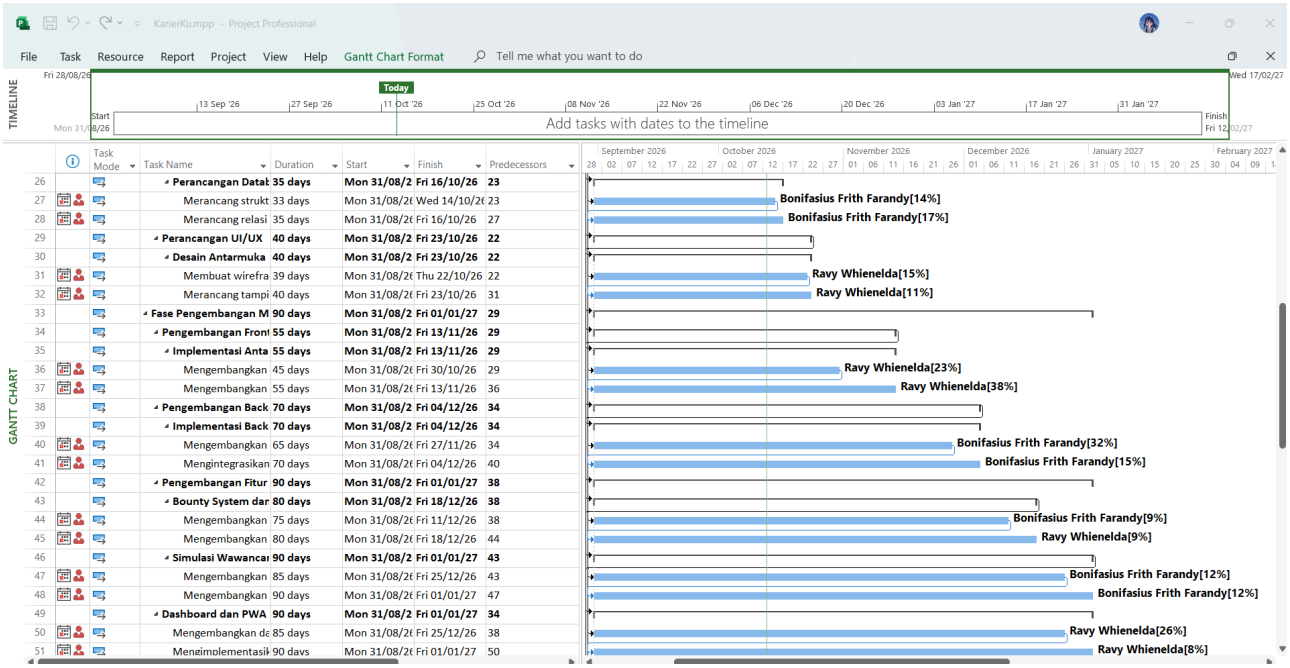
1. Ringkasan Proyek (*Project Summary*)

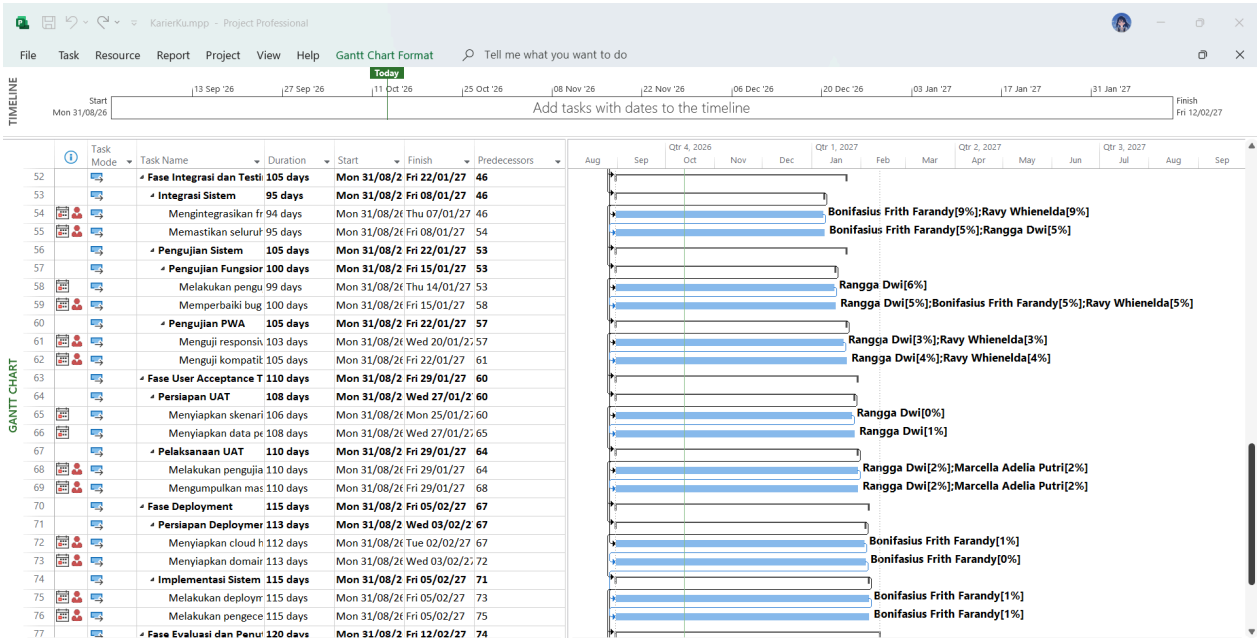
Atribut	Nilai
Tanggal mulai	Senin, 31 Agustus 2026
Tanggal selesai	Minggu, 14 Februari 2027
Durasi	168 hari
Kalender	KarierKu Calendar
Jumlah sumber daya manusia	4 orang
Tarif standar tenaga kerja	Rp100.000/jam
Total jam kerja (Work)	1.880 jam
Biaya tenaga kerja	Rp188.000.000
Biaya lain-lain	Rp66.000.000
Dana cadangan	Rp10.000.000
Total biaya proyek (Cost)	Rp264.000.000

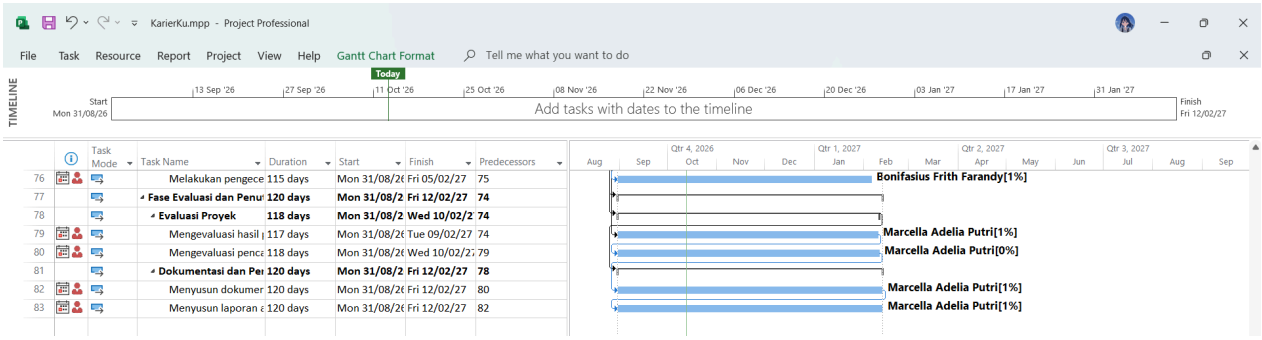
Catatan: Jadwal proyek disusun menggunakan Microsoft Project dengan mengacu pada WBS dan jadwal pengembangan KarierKu. Total biaya proyek sebesar Rp264.000.000 terdiri atas biaya tenaga kerja, biaya lain-lain, dan dana cadangan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB).

GANTT CHART


KarierKu.mpp - Project Professional
File Task Resource Report Project View Help Gantt Chart Format Tell me what you want to do
TIMELINE
Today
Add tasks with dates to the timeline
GANTT CHART
Task Mode Task Name Duration Start Finish Predecessors
1 Fase Inisiasi 10 days Mon 31/08/2 Fri 11/09/26
2 Project Charter 5 days Mon 31/08/2 Fri 04/09/26
3 Identifikasi Proyek 5 days Mon 31/08/2 Fri 04/09/26
4 Menentukan tuju 3 days Mon 31/08/2 Wed 02/09/2
5 Menentukan targ 5 days Mon 31/08/2 Fri 04/09/26 4
6 Identifikasi Stakehold 10 days Mon 31/08/2 Fri 11/09/26 2
7 Identifikasi Kebutu 10 days Mon 31/08/2 Fri 11/09/26 2
8 Mengidentifikasi I 8 days Mon 31/08/2 Wed 09/09/2 2
9 Mengidentifikasi I 10 days Mon 31/08/2 Fri 11/09/26 8
10 Fase Perencanaan dan 25 days Mon 31/08/2 Fri 02/10/26 6
11 Analisis Kebutuhan Si 20 days Mon 31/08/2 Fri 25/09/26 6
12 Kebutuhan Penggu 15 days Mon 31/08/2 Fri 18/09/26 6
13 Menganalisis kebu 13 days Mon 31/08/2 Wed 16/09/2 6
14 Menganalisis kebu 15 days Mon 31/08/2 Fri 18/09/26 13
15 Kebutuhan Fungsio 20 days Mon 31/08/2 Fri 25/09/26 12
16 Menentukan fitur 18 days Mon 31/08/2 Wed 23/09/2 12
17 Menentukan fitur 20 days Mon 31/08/2 Fri 25/09/26 16
18 Perencanaan Proyek 25 days Mon 31/08/2 Fri 02/10/26 11
19 Menyusun jadwal p 23 days Mon 31/08/2 Wed 30/09/2 11
20 Menentukan kebutu 25 days Mon 31/08/2 Fri 02/10/26 19
21 Fase Perancangan Siste 40 days Mon 31/08/2 Fri 23/10/26 18
22 Perancangan Sistem 35 days Mon 31/08/2 Fri 16/10/26 18
23 Perancangan Arsite 30 days Mon 31/08/2 Fri 09/10/26 18
24 Merancang arsite 29 days Mon 31/08/2 Thu 08/10/26 18
25 Merancang integr 30 days Mon 31/08/2 Fri 09/10/26 24
26 Perancangan Datal 35 days Mon 31/08/2 Fri 16/10/26 23
Marcella Adelia Putri
Marcella Adelia Putri[20%]
Marcella Adelia Putri[38%]
Marcella Adelia Putri[30%]
Marcella Adelia Putri[23%]
Marcella Adelia Putri[20%]
Marcella Adelia Putri[25%];Ravy Whienelda[25%]
Marcella Adelia Putri[30%];Bonifasius Frith Farandy[30%]
Marcella Adelia Putri[7%]
Marcella Adelia Putri[16%]
Bonifasius Frith Farandy[21%];Ravy Whienelda[21%]
Bonifasius Frith Farandy[20%]
Ready
New Tasks : Manually Scheduled


KarierKu.mpp - Project Professional
File Task Resource Report Project View Help Gantt Chart Format Tell me what you want to do
TIMELINE
Today
Add tasks with dates to the timeline
GANTT CHART
Task Mode Task Name Duration Start Finish Predecessors
26 Perancangan Datal 35 days Mon 31/08/2 Fri 16/10/26 23
27 Merancang struk 33 days Mon 31/08/2 Wed 14/10/2 23
28 Merancang relasi 35 days Mon 31/08/2 Fri 16/10/26 27
29 Perancangan UI/UX 40 days Mon 31/08/2 Fri 23/10/26 22
30 Desain Antarmuka 40 days Mon 31/08/2 Fri 23/10/26 22
31 Membuat wirefra 39 days Mon 31/08/2 Thu 22/10/26 22
32 Merancang tampi 40 days Mon 31/08/2 Fri 23/10/26 31
33 Fase Pengembangan M 90 days Mon 31/08/2 Fri 01/01/27 29
34 Pengembangan Fron 55 days Mon 31/08/2 Fri 13/11/26 29
35 Implementasi Anta 55 days Mon 31/08/2 Fri 13/11/26 29
36 Mengembangkan 45 days Mon 31/08/2 Fri 30/10/26 29
37 Mengembangkan 55 days Mon 31/08/2 Fri 13/11/26 36
38 Pengembangan Back 70 days Mon 31/08/2 Fri 04/12/26 34
39 Implementasi Back 70 days Mon 31/08/2 Fri 04/12/26 34
40 Mengembangkan 65 days Mon 31/08/2 Fri 27/11/26 34
41 Mengintegrasikan 70 days Mon 31/08/2 Fri 04/12/26 40
42 Pengembangan Fitur 90 days Mon 31/08/2 Fri 01/01/27 38
43 Bounty System dar 80 days Mon 31/08/2 Fri 18/12/26 38
44 Mengembangkan 75 days Mon 31/08/2 Fri 11/12/26 38
45 Mengembangkan 80 days Mon 31/08/2 Fri 18/12/26 44
46 Simulasi Wawanca 90 days Mon 31/08/2 Fri 01/01/27 43
47 Mengembangkan 85 days Mon 31/08/2 Fri 25/12/26 43
48 Mengembangkan 90 days Mon 31/08/2 Fri 01/01/27 47
49 Dashboard dan PWA 90 days Mon 31/08/2 Fri 01/01/27 34
50 Mengembangkan da 85 days Mon 31/08/2 Fri 25/12/26 38
51 Mengimplementasi 90 days Mon 31/08/2 Fri 01/01/27 50
Bonifasius Frith Farandy[14%]
Bonifasius Frith Farandy[17%]
Ravy Whienelda[15%]
Ravy Whienelda[11%]
Ravy Whienelda[23%]
Ravy Whienelda[38%]
Bonifasius Frith Farandy[32%]
Bonifasius Frith Farandy[15%]
Bonifasius Frith Farandy[9%]
Ravy Whienelda[9%]
Bonifasius Frith Farandy[12%]
Bonifasius Frith Farandy[12%]
Ravy Whienelda[26%]
Ravy Whienelda[8%]


KarierKu.mpp - Project Professional
File Task Resource Report Project View Help Gantt Chart Format Tell me what you want to do
TIMELINE
Today
Start Mon 31/08/26
13 Sep '26 27 Sep '26 11 Oct '26 25 Oct '26 08 Nov '26 22 Nov '26 06 Dec '26 20 Dec '26 03 Jan '27 17 Jan '27 31 Jan '27
Add tasks with dates to the timeline
Finish Fri 12/02/27
GANTT CHART
Task Mode Task Name Duration Start Finish Predecessors
52 Fase Integrasi dan Testi 105 days Mon 31/08/2 Fri 22/01/27 46
53 Integrasi Sistem 95 days Mon 31/08/2 Fri 08/01/27 46
54 Mengintegrasikan fr 94 days Mon 31/08/2 Thu 07/01/27 46
55 Memastikan seluruh 95 days Mon 31/08/2 Fri 08/01/27 54
56 Pengujian Sistem 105 days Mon 31/08/2 Fri 22/01/27 53
57 Pengujian Fungsior 100 days Mon 31/08/2 Fri 15/01/27 53
58 Melakukan pengu 99 days Mon 31/08/2 Thu 14/01/27 53
59 Memperbaiki bug 100 days Mon 31/08/2 Fri 15/01/27 58
60 Pengujian PWA 105 days Mon 31/08/2 Fri 22/01/27 57
61 Menguji responsiv 103 days Mon 31/08/2 Wed 20/01/27 57
62 Menguji kompatibi 105 days Mon 31/08/2 Fri 22/01/27 61
63 Fase User Acceptance T 110 days Mon 31/08/2 Fri 29/01/27 60
64 Persiapan UAT 108 days Mon 31/08/2 Wed 27/01/2 60
65 Menyiapkan skenari 106 days Mon 31/08/2 Mon 25/01/27 60
66 Menyiapkan data pe 108 days Mon 31/08/2 Wed 27/01/27 65
67 Pelaksanaan UAT 110 days Mon 31/08/2 Fri 29/01/27 64
68 Melakukan pengujia 110 days Mon 31/08/2 Fri 29/01/27 64
69 Mengumpulkan mas 110 days Mon 31/08/2 Fri 29/01/27 68
70 Fase Deployment 115 days Mon 31/08/2 Fri 05/02/27 67
71 Persiapan Deploymer 113 days Mon 31/08/2 Wed 03/02/2 67
72 Menyiapkan cloud h 112 days Mon 31/08/2 Tue 02/02/27 67
73 Menyiapkan domair 113 days Mon 31/08/2 Wed 03/02/27 72
74 Implementasi Sistem 115 days Mon 31/08/2 Fri 05/02/27 71
75 Melakukan deploym 115 days Mon 31/08/2 Fri 05/02/27 73
76 Melakukan pengece 115 days Mon 31/08/2 Fri 05/02/27 75
77 Fase Evaluasi dan Penut 120 days Mon 31/08/2 Fri 12/02/27 74
Qtr 4, 2026 Qtr 1, 2027 Qtr 2, 2027 Qtr 3, 2027
Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep
Bonifasius Frith Farandy[9%];Ravy Whienelda[9%]
Bonifasius Frith Farandy[5%];Rangga Dwi[5%]
Rangga Dwi[6%]
Rangga Dwi[5%];Bonifasius Frith Farandy[5%];Ravy Whienelda[5%]
Rangga Dwi[3%];Ravy Whienelda[3%]
Rangga Dwi[4%];Ravy Whienelda[4%]
Rangga Dwi[0%]
Rangga Dwi[1%]
Rangga Dwi[2%];Marcella Adelia Putri[2%]
Rangga Dwi[2%];Marcella Adelia Putri[2%]
Bonifasius Frith Farandy[1%]
Bonifasius Frith Farandy[0%]
Bonifasius Frith Farandy[1%]
Bonifasius Frith Farandy[1%]


KarierKu.mpp - Project Professional
File Task Resource Report Project View Help Gantt Chart Format Tell me what you want to do
TIMELINE
Today
Start Mon 31/08/26
13 Sep '26 27 Sep '26 11 Oct '26 25 Oct '26 08 Nov '26 22 Nov '26 06 Dec '26 20 Dec '26 03 Jan '27 17 Jan '27 31 Jan '27
Add tasks with dates to the timeline
Finish Fri 12/02/27
Task Mode Task Name Duration Start Finish Predecessors
76 Melakukan pengece 115 days Mon 31/08/2 Fri 05/02/27 75
77 Fase Evaluasi dan Penut 120 days Mon 31/08/2 Fri 12/02/27 74
78 Evaluasi Proyek 118 days Mon 31/08/2 Wed 10/02/2 74
79 Mengevaluasi hasil p 117 days Mon 31/08/2 Tue 09/02/27 74
80 Mengevaluasi penca 118 days Mon 31/08/2 Wed 10/02/27 79
81 Dokumentasi dan Pe 120 days Mon 31/08/2 Fri 12/02/27 78
82 Menyusun dokumer 120 days Mon 31/08/2 Fri 12/02/27 80
83 Menyusun laporan a 120 days Mon 31/08/2 Fri 12/02/27 82
Qtr 4, 2026 Qtr 1, 2027 Qtr 2, 2027 Qtr 3, 2027
Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep
Bonifasius Frith Farandy[1%]
Marcella Adelia Putri[1%]
Marcella Adelia Putri[0%]
Marcella Adelia Putri[1%]
Marcella Adelia Putri[1%]

3. Tabel Tugas (*Task Sheet*)

ID	WBS	Nama Tugas	Durasi	Mulai	Selesai	Pred.	Resource	Biaya
1	1	Fase Inisiasi	14 days	Mon 31/08/26	Sun 13/09/26	—	—	Rp10.000.000
2	1.1	Project Charter	7 days	Mon 31/08/26	Sun 06/09/26	—	—	Rp4.000.000
3	1.1.1	Identifikasi Proyek	7 days	Mon 31/08/26	Sun 06/09/26	—	—	Rp4.000.000
4	1.1.1.1	Menentukan tujuan dan ruang lingkup awal proyek	3 days	Mon 31/08/26	Wed 02/09/26	—	Marcella	Rp2.400.000
5	1.1.1.1	Menentukan target pengguna KarierKu	2 days	Thu 03/09/26	Fri 04/09/26	4	Marcella	Rp1.600.000
6	1.1	Identifikasi Stakeholder	7 days	Mon 07/09/26	Sun 13/09/26	2	—	Rp6.000.000
7	1.1.1	Identifikasi Kebutuhan Stakeholder	7 days	Mon 07/09/26	Sun 13/09/26	2	—	Rp6.000.000
8	1.1.1.1	Mengidentifikasi kebutuhan pencari kerja	3 days	Mon 07/09/26	Wed 09/09/26	2	Marcella	Rp1.600.000
9	1.1.1.1	Mengidentifikasi kebutuhan perusahaan/rekruter	3 days	Thu 10/09/26	Sat 12/09/26	8	Marcella; Biaya Lain-Lain	Rp4.400.000
10	2	Fase Perencanaan dan Analisis Kebutuhan	21 days	Mon 14/09/26	Sun 04/10/26	6	—	Rp20.600.000
11	2.1	Analisis Kebutuhan Sistem	14 days	Mon 14/09/26	Sun 27/09/26	6	—	Rp13.200.000
12	2.1.1	Kebutuhan Pengguna	7 days	Mon 14/09/26	Sun 20/09/26	6	—	Rp4.800.000
13	2.1.1.1	Menganalisis kebutuhan pencari kerja	3 days	Mon 14/09/26	Wed 16/09/26	6	Marcella	Rp2.400.000
14	2.1.1.1	Menganalisis kebutuhan perusahaan	3 days	Thu 17/09/26	Sat 19/09/26	14	Marcella	Rp2.400.000
15	2.1.1	Kebutuhan Fungsional	7 days	Mon 21/09/26	Sun 27/09/26	12	—	Rp8.400.000
16	2.1.1.1	Menentukan fitur registrasi, profil, dan lowongan	3 days	Mon 21/09/26	Wed 23/09/26	12	Marcella	Rp3.600.000
17	2.1.1.1	Menentukan fitur Bounty System, Konverter Aktivitas, Simulasi Wawancara AI, dan Smart Matchmaking	4 days	Thu 24/09/26	Sun 27/09/26	17	Marcella; Bonifasius	Rp4.800.000
18	2.1	Perencanaan Proyek	7 days	Mon 28/09/26	Sun 04/10/26	11	—	Rp7.400.000
19	2.1.1	Menyusun jadwal pengembangan proyek	3 days	Mon 28/09/26	Wed 30/09/26	11	Marcella	Rp1.200.000
20	2.1.1	Menentukan kebutuhan sumber daya dan anggaran proyek	4 days	Thu 01/10/26	Sun 04/10/26	20	Marcella; Biaya Lain-Lain	Rp6.200.000
21	3	Fase Perancangan Sistem dan UI/UX	21 days	Mon 05/10/26	Sun 25/10/26	19	—	Rp31.400.000
22	3.1	Perancangan Sistem	7 days	Mon 05/10/26	Sun 11/10/26	19	—	Rp18.000.000
23	3.1.1	Perancangan Arsitektur Sistem	4 days	Mon 05/10/26	Thu 08/10/26	19	—	Rp9.600.000
24	3.1.1.1	Merancang arsitektur frontend, backend, dan database	4 days	Mon 05/10/26	Thu 08/10/26	19	Ravy; Bonifasius	Rp4.800.000
25	3.1.1.1	Merancang integrasi AI dan cloud	3 days	Fri 09/10/26	Sun 11/10/26	26	Bonifasius	Rp4.800.000
26	3.1.1	Perancangan Database	7 days	Mon 12/10/26	Sun 18/10/26	24	—	Rp8.400.000
27	3.1.1.1	Merancang struktur database PostgreSQL	3 days	Fri 09/10/26	Sun 11/10/26	24	Bonifasius	Rp3.600.000
28	3.1.1.1	Merancang relasi dan kebutuhan data sistem	4 days	Mon 12/10/26	Thu 15/10/26	29	Bonifasius	Rp4.800.000
29	3.1	Perancangan UI/UX	7 days	Mon 19/10/26	Sun 25/10/26	23	—	Rp13.400.000
30	3.1.1	Desain Antarmuka	7 days	Mon 19/10/26	Sun 25/10/26	23	—	Rp13.400.000
31	3.1.1.1	Membuat wireframe dan prototype	4 days	Mon 12/10/26	Thu 15/10/26	23	Ravy	Rp4.800.000
32	3.1.1.1	Merancang tampilan website berbasis PWA	3 days	Fri 16/10/26	Sun 18/10/26	33	Ravy; Biaya Lain-Lain	Rp8.600.000
33	4	Fase Pengembangan MVP	70 days	Mon 26/10/26	Sun 03/01/27	31	—	Rp138.000.000
34	4.1	Pengembangan Frontend	21 days	Mon 26/10/26	Sun 15/11/26	31	—	Rp25.200.000
35	4.1.1	Implementasi Antarmuka	21 days	Mon 26/10/26	Sun 15/11/26	31	—	Rp25.200.000
36	4.1.1.1	Mengembangkan halaman registrasi, login, dan profil	7 days	Mon 26/10/26	Sun 01/11/26	31	Ravy	Rp8.400.000
37	4.1.1.1	Mengembangkan halaman pencarian dan pengelolaan lowongan	14 days	Mon 02/11/26	Sun 15/11/26	38	Ravy	Rp16.800.000

ID	WBS	Nama Tugas	Durasi	Mulai	Selesai	Pred.	Resource	Biaya
38	4.1	Pengembangan Backend dan Database	21 days	Mon 16/11/26	Sun 06/12/26	36	—	Rp25.200.000
39	4.1.1	Implementasi Backend	21 days	Mon 16/11/26	Sun 06/12/26	36	—	Rp25.200.000
40	4.1.1.1	Mengembangkan API menggunakan Node.js dan Express.js	14 days	Mon 16/11/26	Sun 29/11/26	36	Bonifasius	Rp16.800.000
41	4.1.1.1	Mengintegrasikan backend dengan PostgreSQL	7 days	Mon 30/11/26	Sun 06/12/26	42	Bonifasius	Rp8.400.000
42	4.1	Pengembangan Fitur Utama	28 days	Mon 07/12/26	Sun 03/01/27	40	—	Rp28.000.000
43	4.1.1	Bounty System dan Konverter Aktivitas	14 days	Mon 07/12/26	Sun 20/12/26	40	—	Rp11.200.000
44	4.1.1.1	Mengembangkan fitur studi kasus/uji kompetensi	7 days	Mon 07/12/26	Sun 13/12/26	40	Ravy	Rp5.600.000
45	4.1.1.1	Mengembangkan fitur konversi aktivitas non-formal	7 days	Mon 14/12/26	Sun 20/12/26	46	Ravy	Rp5.600.000
46	4.1.1	Simulasi Wawancara AI dan Smart Matchmaking	14 days	Mon 21/12/26	Sun 03/01/27	45	—	Rp16.800.000
47	4.1.1.1	Mengembangkan fitur simulasi wawancara berbasis AI	7 days	Mon 21/12/26	Sun 27/12/26	45	Bonifasius	Rp8.400.000
48	4.1.1.1	Mengembangkan fitur Smart Matchmaking dan rekomendasi lowongan	7 days	Mon 28/12/26	Sun 03/01/27	49	Bonifasius	Rp8.400.000
49	4.1	Dashboard dan PWA	70 days	Mon 26/10/26	Sun 03/01/27	36	—	Rp59.600.000
50	4.1.1	Mengembangkan dashboard pencari kerja dan perusahaan	21 days	Mon 07/12/26	Sun 27/12/26	40	Ravy	Rp18.000.000
51	4.1.1	Mengimplementasikan teknologi Progressive Web App	7 days	Mon 28/12/26	Sun 03/01/27	52	Ravy; Biaya Lain-Lain	Rp41.600.000
52	5	Fase Integrasi dan Testing	21 days	Mon 04/01/27	Sun 24/01/27	48	—	Rp30.000.000
53	5.1	Integrasi Sistem	7 days	Mon 04/01/27	Sun 10/01/27	48	—	Rp10.000.000
54	5.1.1	Mengintegrasikan frontend, backend, database, dan AI	4 days	Mon 04/01/27	Thu 07/01/27	48	Bonifasius; Ravy	Rp6.400.000
55	5.1.1	Memastikan seluruh fitur dapat berjalan secara terintegrasi	3 days	Fri 08/01/27	Sun 10/01/27	56	Bonifasius; Ravy; Rangga	Rp3.600.000
56	5.1	Pengujian Sistem	14 days	Mon 11/01/27	Sun 24/01/27	55	—	Rp20.000.000
57	5.1.1	Pengujian Fungsional	7 days	Mon 11/01/27	Sun 17/01/27	55	—	Rp8.400.000
58	5.1.1.1	Melakukan pengujian setiap fitur	4 days	Mon 11/01/27	Thu 14/01/27	55	Rangga	Rp4.800.000
59	5.1.1.1	Memperbaiki bug dan kesalahan sistem	3 days	Fri 15/01/27	Sun 17/01/27	60	Bonifasius; Ravy	Rp3.600.000
60	5.1.1	Pengujian PWA	7 days	Mon 18/01/27	Sun 24/01/27	59	—	Rp11.600.000
61	5.1.1.1	Menguji responsivitas pada berbagai perangkat	3 days	Mon 18/01/27	Wed 20/01/27	59	Rangga	Rp2.400.000
62	5.1.1.1	Menguji kompatibilitas browser	4 days	Thu 21/01/27	Sun 24/01/27	63	Rangga; Biaya Lain-Lain	Rp9.200.000
63	6	Fase User Acceptance Test (UAT)	7 days	Mon 25/01/27	Sun 31/01/27	62	—	Rp10.400.000
64	6.1	Persiapan UAT	3 days	Mon 25/01/27	Wed 27/01/27	62	—	Rp2.000.000
65	6.1.1	Menyiapkan skenario pengujian pengguna	1 day	Mon 25/01/27	Mon 25/01/27	62	Rangga	Rp800.000
66	6.1.1	Menyiapkan data pengujian	2 days	Tue 26/01/27	Wed 27/01/27	67	Rangga	Rp1.200.000
67	6.1	Pelaksanaan UAT	4 days	Thu 28/01/27	Sun 31/01/27	66	—	Rp8.400.000
68	6.1.1	Melakukan pengujian bersama pengguna	2 days	Thu 28/01/27	Fri 29/01/27	66	Marcella; Rangga	Rp800.000
69	6.1.1	Mengumpulkan masukan dan melakukan perbaikan	2 days	Sat 30/01/27	Sun 31/01/27	70	Bonifasius; Rangga; Ravy; Biaya Lain-Lain	Rp7.600.000
70	7	Fase Deployment	7 days	Mon 01/02/27	Sun 07/02/27	69	—	Rp7.800.000
71	7.1	Persiapan Deployment	3 days	Mon 01/02/27	Wed 03/02/27	69	—	Rp1.200.000
72	7.1.1	Menyiapkan cloud hosting dan database	2 days	Mon 01/02/27	Tue 02/02/27	69	Bonifasius	Rp800.000
73	7.1.1	Menyiapkan domain dan SSL	1 day	Wed 03/02/27	Wed 03/02/27	74	Bonifasius	Rp400.000
74	7.1	Implementasi Sistem	4 days	Thu 04/02/27	Sun 07/02/27	73	—	Rp6.600.000

ID	WBS	Nama Tugas	Durasi	Mulai	Selesai	Pred.	Resource	Biaya
75	7.1.1	Melakukan deployment aplikasi KarierKu	2 days	Thu 04/02/27	Fri 05/02/27	75	Bonifasius	Rp800.000
76	7.1.1	Melakukan pengecekan sistem setelah deployment	2 days	Sat 06/02/27	Sun 07/02/27	77	Bonifasius; Rangga; Biaya Lain-Lain	Rp5.800.000
77	8	Fase Evaluasi dan Penutupan	7 days	Mon 08/02/27	Sun 14/02/27	76	—	Rp15.800.000
78	8.1	Evaluasi Proyek	3 days	Mon 08/02/27	Wed 10/02/27	76	—	Rp1.200.000
79	8.1.1	Mengevaluasi hasil pengembangan MVP	2 days	Mon 08/02/27	Tue 09/02/27	76	Marcella	Rp800.000
80	8.1.1	Mengevaluasi pencapaian tujuan dan kebutuhan proyek	1 day	Wed 10/02/27	Wed 10/02/27	81	Marcella	Rp400.000
81	8.1	Dokumentasi dan Penutupan	4 days	Thu 11/02/27	Sun 14/02/27	80	—	Rp14.600.000
82	8.1.1	Menyusun dokumentasi sistem dan proyek	2 days	Thu 11/02/27	Fri 12/02/27	82	Marcella; Rangga	Rp800.000
83	8.1.1	Menyusun laporan akhir dan menutup proyek	2 days	Sat 13/02/27	Sun 14/02/27	84	Marcella; Biaya Lain-Lain	Rp3.800.000
84	—	Dana Cadangan	0 days	—	—	—	Dana Cadangan	Rp10.000.000

4. *Resource Sheet* & Rekap Biaya

Resource	Inisial	Peran (PLAN-02)	Tarif	Total Work	Biaya Tenaga Kerja
Marcella Adelia Putri	**MAP**	**Project Manager, System Analyst**	**Rp100.000/jam**	**400 jam**	**Rp40.000.000**
Bonifasius	**–**	**AI & Backend Developer, DevOps Engineer**	**Rp100.000/jam**	**600 jam**	**Rp60.000.000**
Ravy	**–**	**Full Stack Developer, UI/UX Designer**	**Rp100.000/jam**	**640 jam**	**Rp64.000.000**
Rangga	**–**	**QA & Tester**	**Rp100.000/jam**	**240 jam**	**Rp24.000.000**
Biaya non-SDM	**–**	**Cloud/server, API AI, tools, testing, dan kebutuhan proyek lainnya**	**–**	**–**	**Rp66.000.000**
Dana cadangan	**–**	**Cadangan anggaran proyek**	**–**	**—**	**Rp10.000.000**
TOTAL	**–**	**–**	**–**	**1.880 jam (total proyek)**	**Rp264.000.000**

Dibuat Oleh		
Nama	:	Marcella Adelia Putri
Jabatan	:	Manajer proyek
Tanggal	:	16 September 2026

Disetujui oleh		
Nama	:	Dr. Albertus Dwiyoga Widiantoro, S.Kom., M.Kom
Jabatan	:	Pemilik Proyek
Tanggal	:	16 September 2026

PEDOMAN HASIL KERJA
(WORK RESULT GUIDLINE)

Nama Proyek : **Aplikasi Recruitment & Job Portal (KarierKu)**

Manajer Proyek : **Marcella Adelia Putri**

Bidang : **Sistem Informasi / Pengembangan Aplikasi**

Dibuat oleh : **Tim Proyek KarierKu**

Tanggal : **24 September 2026**

Hasil #1	
Sesuai dengan *scope* & jadwal	☑
Sesuai dengan *scope*, tidak sesuai dengan jadwal	☐
Tidak sesuai dengan *scope* & jadwal	☐

Alasan, jika tidak sesuai:

Semua proses pada hasil pertama berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan tanpa mendapatkan kendala. komunikasi proyek terlaksana sesuai rencana, tahapan siklus proyek, dan jadwal yang telah ditetapkan.

Pengadaan Biaya

Sesuai Anggaran	**Dibawah Anggaran**	**Melebihi Anggaran**
☑	☐	☐

Catatan Tambahan:

Hal yang terkait dengan hasil 1 ini adalah sebagai betikut
Meliputi Pertemuan Manajemen (akhir fase/kebutuhan), Pertemuan Pembukaan (awal proyek), Pertemuan Tim Proyek (mingguan), Pertemuan UAT & Go-Live (sebelum UAT), dan Pertemuan Penutupan (akhir proyek).

Meliputi Laporan Kemajuan Proyek Mingguan, Status Meeting Agenda, Minutes of Meeting (MoM), dan Laporan UAT & Go-Live.

Dan terakhir Seluruh laporan terdistribusi kepada pihak terkait (Project Owner, Tim Proyek, dan Kepala Unit Karya) dengan tetap menjaga kerahasiaan data pengguna.

Hasil #2	
Sesuai dengan *scope* & jadwal	☐

Sesuai dengan *scope*, tidak sesuai dengan jadwal ☑		
Tidak sesuai dengan *scope* & jadwal ☐		
Alasan, jika tidak sesuai: **Seluruh pekerjaan dari perencanaan 1.0 sampai 8.0 berhasil diselesaikan dengan aman, namun terjadi perubahan jam kerja dengan total tambahan sebesar 154 jam dari yang direncanakan 1.880 menjadi 2.034 jam. Penambahan waktu ini terjadi pada perencanaan 4.0 yaitu fase pengembangan MVP, lebih detailnya untuk penyesuaian fitur, penyelesaian fungsi sistem, dan perbaikan bug.**		
Pengadaan Biaya		
Sesuai Anggaran ☐	**Dibawah Anggaran** ☐	**Melebihi Anggaran** ☑
Catatan Tambahan: **Anggaran yang disediakan dari perencanaan ialah Rp 254.000.000 dengan jam kerja 1.880, setelah terjadi perubahan jam kerja biaya akhir yang dikeluarkan adalah Rp 274.800.000.** **Selisih biaya sebesar Rp 20.800.000 sedangkan dana cadangan dari proyek ini hanyalah Rp 10.000.000**		

PERKIRAAN BIAYA PENYELESAIAN PROYEK

(ESTIMATION COST AT COMPLETION)

Nama Proyek : Aplikasi Recruitment & Job Portal (KarierKu)
Manajer Proyek : Marcella Adelia Putri
Bidang : Sistem Informasi / Pengembangan Aplikasi

Dibuat oleh : Tim Proyek KarierKu
Tanggal : 24 September 2026

Analisis Dalam Jam						Analisis Dalam Rupiah					
No WBS	Deskripsi Aktivitas	Jam Anggaran	Jam Aktual	Est. to Complete	Est. at Complete	Selisih	Rupiah Anggaran	Rupiah Aktual	Est. to Complete	Est. at Complete	Selisih
1.0	Fase Inisiasi	80	84	0	84	4	Rp 10.000.000	Rp 10.800.000	Rp 0	Rp 10.800.000	Rp 800.000
2.0	Fase Perencanaan dan Analisis Kebutuhan	176	192	0	192	16	Rp 20.600.000	Rp 22.500.000	Rp 0	Rp 22.500.000	Rp 1.900.000
3.0	Fase Perancangan Sistem dan UI/UX	264	276	0	276	12	Rp 31.400.000	Rp 33.000.000	Rp 0	Rp 33.000.000	Rp 1.600.000
4.0	Fase Pengembangan MVP	1020	1110	0	1110	90	Rp 138.000.000	Rp 150.000.000	Rp 0	Rp 150.000.000	Rp 12.000.000
5.0	Fase Integrasi dan Testing	240	252	0	252	12	Rp 30.000.000	Rp 32.000.000	Rp 0	Rp 32.000.000	Rp 2.000.000
6.0	Fase User Acceptance Test (UAT)	44	48	0	48	4	Rp 10.400.000	Rp 11.000.000	Rp 0	Rp 11.000.000	Rp 600.000
7.0	Fase Deployment	28	32	0	32	4	Rp 7.800.000	Rp 8.500.000	Rp 0	Rp 8.500.000	Rp 700.000
8.0	Fase Evaluasi dan Penutupan	28	40	0	40	12	Rp 5.800.000	Rp 7.000.000	Rp 0	Rp 7.000.000	Rp 1.200.000
	TOTAL	**1880**	**2034**	**0**	**2034**	**154**	**Rp 254.000.000**	**Rp 274.800.000**	**Rp 0**	**Rp 274.800.000**	**Rp 20.800.000**

Ringkasan Perhitungan

- Total anggaran seluruh WBS (baseline) = Rp254.000.000 untuk 1.880 jam.
- Dana cadangan proyek = Rp10.000.000, sehingga total perencanaan proyek = Rp264.000.000.
- Total biaya aktual akhir/EAC = Rp274.800.000 untuk 2.034 jam.
- Est. to Complete (ETC) = Rp0 karena seluruh WBS telah selesai.
- Selisih terhadap anggaran WBS = Rp20.800.000. Jika dibandingkan dengan total perencanaan termasuk dana cadangan Rp264.000.000, terdapat kelebihan biaya Rp10.800.000.
- Rata-rata biaya per jam berdasarkan anggaran WBS = Rp254.000.000 ÷ 1.880 jam ≈ Rp135.106/jam.

Detail dan Catatan Setiap WBS

WBS 1.0 : Fase Inisiasi

Kegiatan pada fase ini terdiri dari penyusunan Project Charter dan identifikasi stakeholder. Anggaran yang direncanakan sebesar 80 jam dengan biaya Rp10.000.000. Dalam realisasi akhir proyek, pekerjaan membutuhkan 84 jam dengan biaya Rp10.800.000. Tambahan 4 jam dan Rp800.000 digunakan untuk penyelesaian dokumen awal, koordinasi, dan pemantapan pihak-pihak yang terlibat dalam proyek.

WBS 2.0 : Fase Perencanaan dan Analisis Kebutuhan

Kegiatan meliputi analisis kebutuhan sistem dan perencanaan proyek. Anggaran awal sebesar 176 jam dan Rp20.600.000. Realisasi akhir menjadi 192 jam dan Rp22.500.000. Selisih terjadi karena proses penggalian, pembahasan, dan penyelarasan kebutuhan sistem memerlukan waktu tambahan sebelum proyek masuk ke tahap perancangan.

WBS 3.0 : Fase Perancangan Sistem dan UI/UX

Kegiatan meliputi perancangan sistem serta perancangan UI/UX. Anggaran awal sebesar 264 jam dan Rp31.400.000. Realisasi akhir sebesar 276 jam dan Rp33.000.000. Tambahan 12 jam dan Rp1.600.000 digunakan untuk revisi rancangan, penyesuaian alur sistem, serta penyempurnaan tampilan berdasarkan hasil analisis kebutuhan.

WBS 4.0 : Fase Pengembangan MVP

Kegiatan meliputi pengembangan frontend, backend/database, fitur utama, serta dashboard/PWA. Anggaran awal merupakan bagian terbesar proyek, yaitu 1.020 jam dengan Rp138.000.000. Realisasi akhir mencapai 1.110 jam dan Rp150.000.000. Selisih 90 jam dan Rp12.000.000 terjadi karena pengembangan fitur memerlukan penyesuaian, penyelesaian fungsi sistem, dan perbaikan selama proses pembangunan MVP.

WBS 5.0 : Fase Integrasi dan Testing

Kegiatan meliputi integrasi sistem dan pengujian sistem. Anggaran awal sebesar 240 jam dan Rp30.000.000. Realisasi akhir menjadi 252 jam dan Rp32.000.000. Tambahan 12 jam dan Rp2.000.000 digunakan untuk proses integrasi, penemuan bug, perbaikan, dan pengujian ulang agar sistem dapat digunakan sebelum memasuki UAT.

WBS 6.0 : Fase User Acceptance Test (UAT)

Kegiatan meliputi persiapan UAT dan pelaksanaan UAT. Anggaran awal sebesar 44 jam dengan biaya Rp10.400.000. Pada realisasi akhir, kegiatan membutuhkan 48 jam dan Rp11.000.000. Tambahan 4 jam dan Rp600.000 dialokasikan untuk pelaksanaan pengujian pengguna, pencatatan hasil pengujian, klarifikasi temuan, dan pengujian ulang apabila terdapat bagian yang perlu diperbaiki.

WBS 7.0 : Fase Deployment

Kegiatan meliputi persiapan deployment dan implementasi sistem. Anggaran awal sebesar 28 jam dengan biaya Rp7.800.000. Realisasi akhir menjadi 32 jam dan Rp8.500.000. Tambahan waktu dan biaya digunakan untuk konfigurasi lingkungan deployment, penyiapan sistem, proses implementasi, serta pengecekan sistem setelah diterapkan.

WBS 8.0 : Fase Evaluasi dan Penutupan

Kegiatan meliputi evaluasi proyek serta dokumentasi dan penutupan proyek. Anggaran awal sebesar 28 jam dan Rp5.800.000. Realisasi akhir mencapai 40 jam dan Rp7.000.000. Tambahan 12 jam dan Rp1.200.000 digunakan untuk evaluasi hasil proyek, penyelesaian dokumentasi, pemeriksaan akhir, dan kegiatan penutupan proyek.

LAPORAN PELAKSANAAN PROYEK

No. 06/CLOS-01/II/2027

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marcella Adelia Putri

Jabatan : Manajer Proyek *(Project Manager)*

Alamat : Jl. Pawiyatan Luhur II No. 48 Tinjomoyo, Semarang

Selaku Pelaksana Proyek Aplikasi Recruitment & Job Portal (KarierKu) dengan spesifikasi yang tercantum dalam "Dokumen Definisi Proyek" dan "Dokumen Perencanaan Manajemen Proyek" (terlampir).

Dengan ini kami melaporkan bahwa pelaksanaan proyek Aplikasi Recruitment & Job Portal (KarierKu) berdasarkan Surat Penugasan Nomor : 06/SP/KU/VIII/2026 tanggal 31 Agustus 2026 telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Laporan Pelaksanaan Proyek ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 14 Februari 2027

Pelaksana Proyek

Marcella Adelia Putri

Manajer Proyek

LAPORAN PENYELESAIAN PROYEK

No. 06/CLOS-02/II/2027

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Albertus Dwiyoga Widiantoro, S.Kom., M.Kom.

Jabatan : Pemilik Proyek *(Project Owner)*

Alamat : Jl. Pawiyatan Luhur IV No. 1, Bendan Duwur, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50234

Selaku Pengawas Pelaksana Proyek Aplikasi Recruitment & Job Portal (KarierKu) dengan spesifikasi yang tercantum dalam "Dokumen Definisi Proyek" dan "Dokumen Perencanaan Manajemen Proyek" (terlampir).

Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Proyek nomor 06/CLOS-01/II/2027 tanggal 14 Februari 2027 dari Manajer Proyek, bersama ini kami melaporkan bahwa penyelesaian proyek Aplikasi Recruitment & Job Portal (KarierKu) berdasarkan Surat Penugasan Nomor: 06/SP/KU/VIII/2026 tanggal 31 Agustus 2026 telah diselesaikan dengan baik.

Demikian Laporan Penyelesaian Proyek ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Semarang, 14 Februari 2027

Pengawas Pelaksana Proyek

Dr. Albertus Dwiyoga Widiantoro, S.Kom., M.Kom.

Pemilik Proyek

BERITA ACARA SERAH TERIMA PROYEK

No. 06/CLOS-04/II/2027

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Albertus Dwiyoga Widiantoro, S.Kom., M.Kom.
   Jabatan : Pemilik Proyek (Project Owner)
   Alamat : —
   Selanjutnya disebut : Pengawas Proyek

2. Nama : Marcella Adelia Putri
   Jabatan : Manajer Proyek (Project Manager)
   Alamat : —
   Selanjutnya disebut : Pelaksana Proyek

Menerangkan sebagai berikut:

Proyek	:	Aplikasi Recruitment & Job Portal (KarierKu)
Nomor Surat Tugas / tanggal	:	06/SP/KU/VIII/2026 / 31 Agustus 2026
Nomor Laporan Pelaksanaan / tanggal	:	06/CLOS-01/II/2027 / 14 Februari 2027
Nomor Laporan Penyelesaian / tanggal	:	06/CLOS-02/II/2027 / 14 Februari 2027

Proyek Aplikasi Recruitment & Job Portal (KarierKu) telah selesai dikerjakan dan diserahterimakan dari Pelaksana Proyek kepada Pengawas Proyek dalam keadaan baik dan lengkap, meliputi aplikasi berbasis web dengan teknologi Progressive Web App (PWA), fitur-fitur utama KarierKu, dokumentasi sistem, panduan penggunaan aplikasi, serta dokumen manajemen proyek.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 14 Februari 2027

Pelaksana Proyek	Pengawas Proyek
Marcella Adelia Putri	Dr. Albertus Dwiyoga Widiantoro, S.Kom., M.Kom.
Manajer Proyek	Pemilik Proyek
